

Comune:

Castelnovo nè Monti\_ Reggio Emilia

Titolo:

**Riquilificazione energetica** della Scuola  
Media "BISMANTOVA" di via U.Sozzi 1

Committente:

Comune di Castelnovo nè Monti.

Responsabile del procedimento:

ing. Chiara Cantini

Responsabile del progetto architettonico:

arch. Carlo Margini di Lapis architetture

12\_2017

Revisione:

Fase di progetto:

**1 STRALCIO**

progetto definitivo-esecutivo

Gruppo di progetto:

**capogruppo: Lapis architetture** Via Emilia S.Stefano n.31 -  
Reggio Emilia tel 0522/454599 Fax 0522/537594 e-mail: info@lapis.re.it

**impianti meccanici: Studio Helica di Nicholas**

**ing.Ghidoni** - Via Emilia S.Stefano n°31 Reggio Emilia tel. 375 627 80 97  
e-mail: nicholas@studiohelica.it

**impianti elettrici: P.Ind Ficarelli Valerio** - Via G.Rossa n°25

Cavriato (RE) tel/fax. 0522575088 e-mail: v.ficarelli@virgilio.it

Scala:

Orientamento:

Titolo di disegno:


**Cronoprogramma lavori**

**E.ar.2.09**

**Cronoprogramma fasi attuative: Tempi massimi di svolgimento varie attività**

- inizio lavori entro il .....
- esecuzione entro il .....

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
	1	Consegna dei lavori			1
	2	Preparazione cantiere			5
	3	Opere provvisoriale			7
	4	Demolizioni e rimozioni			10
	5	Opere di isolamento e rivestimento, lattonerie			70
	6	Opere di Finitura			13
	7	Opere da Serramentista			14
	8	Opere da fabbro			15
	9	Assistenze murarie			12
	10	Smobilizzo cantiere			3

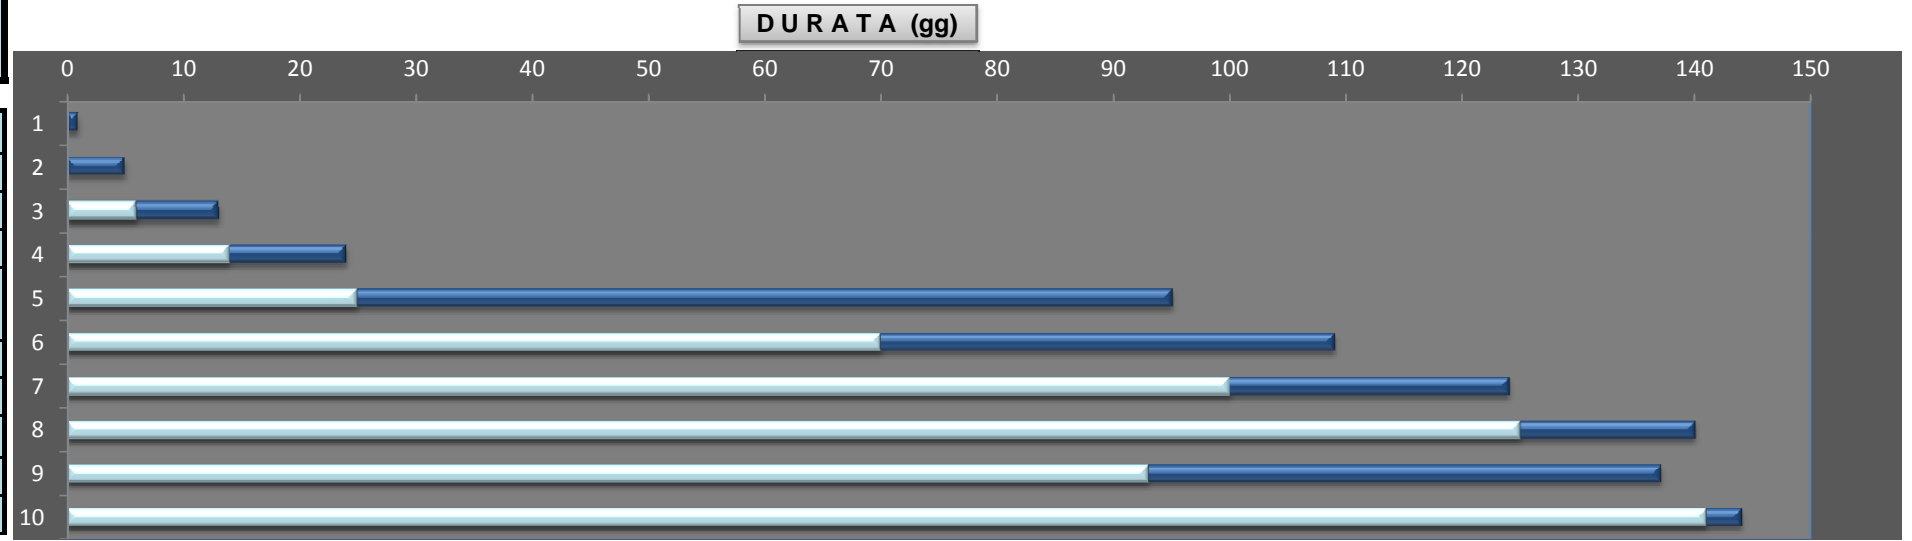

Inizio dei lavori

Fine lavori

TC 150 gg. naturali consecutivi

0 gg

150 gg
